

PARAMETRES

Navire

SOMM

Liste de travaux

SM_2026_ATM_3N10

NTI

Tout

Code comptable

PHT1ATSO

Imput°

AT

DMD & DFMD

01/01/2024

06/04/2025




Indicateurs globaux



Travaux

Avancement des interventions



247

Interventions à réaliser

36

FI à traiter


105

Nb FI sans commande



Budgets

Avancement financier

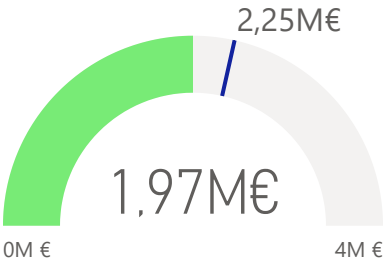

2M

Budget total


277,2...

Budget restant



Livrables

Avancement des livrables



8

ERQ livrés

7

ERQ Restants à livrer

PARAMETRES

Liste de travaux

SM_2026_ATM_3N10

NTI

Tout

Type intervention

Tout

DMD & DFMD

01/01/2024

06/04/2025




Suivi documentaire - livrables

Livraison ERQ

53,33%

Taux livraison ERQ

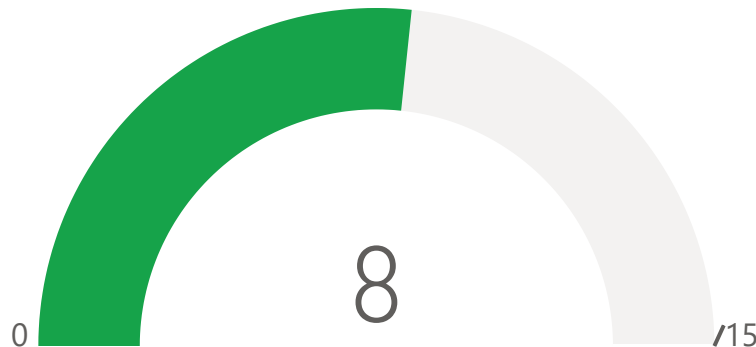

7

ERQ Restants à livrer

247

Nb de lignes total de l'AT

Travaux réalisés - avancement des ERQ

15


Tvx réalisés

232

Tvx non réalisés

6

Terminé(s) sans ERQ

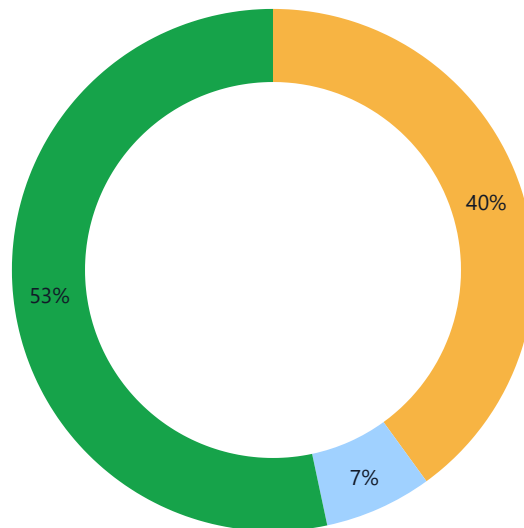

- ERQ à faire
- ERQ en cours
- ERQ rédigés
- ERQ livrés

Avancement FI	Nb FI
10-5_ERQ_EMIS_BORD	8
08_erq_en_cours	1
07_ATTENTE_CRT	2
06_TVX_TESTES	4

PARAMETRES

Navire

SOMM

Liste de travaux

SM_2026_ATM_3N10

NTI

Tout

Code comptable

PHT1ATSO


Imput°

AT



Suivi budgétaire et contractuel

Avancement financier



2M

Budget initial

1,97M

Dépenses engagées

277,2K€

Budget restant

FAM	Budget alloué	Dépense engagée	Écart
AI	13 601 €	148 437 €	-134 836 €
AM	48 905 €	161 387 €	-112 482 €
AP	416 897 €	47 073 €	369 824 €
BA	338 913 €	89 213 €	249 700 €
CH		7 000 €	-7 000 €
CO	207 951 €	224 212 €	-16 261 €
DI		15 598 €	-15 598 €
EL	95 601 €	90 045 €	5 556 €
EM	79 514 €	38 697 €	40 817 €
GE	0 €		0 €
IC	26 761 €	199 623 €	-172 862 €
MP	922 419 €	580 714 €	341 705 €
NV	17 120 €	20 391 €	-3 271 €
OU	15 566 €		15 566 €
PE		293 987 €	-293 987 €
SE	66 445 €	56 112 €	10 333 €
Total	2 249 693 €	1 972 489 €	277 204 €

Fournisseur	N° commande	Intitulé	Montant (PFA)
ABARNOU	SM-2025-00236	SM AT3_10 Echafaudages au forfait (Porte de ...	35 974,00
ABARNOU	SM-CDE-2026-0016	SM AT3_10 Mise en place d'une sécurisation su...	455,00
ABARNOU	SM-CDE-2026-0030	SM AT3_10 index344 Echafaudage aux milieu	475,00
ABARNOU	SM-CDE-2026-0035	SME - AT3N10 - Visite MPX - mise en place de ...	424,00
ABARNOU	SM-CDE-2026-0098	SM AT3_10 Index1 485 Echafaudage Abarnou (...	8 986,00
ABARNOU	SM-CDE-2026-0102	SME - AT3N10 - Mini d'AT - bungalows - mise ...	626,00
ABARNOU	SM-CDE-2026-0125	ATM BCR SOMME - Mise en place d'une sécuri...	929,00
ADS	SM-2025-00164	BCR SOMME - centrales de détection H2S (Nb ...	1 928,20
ADS	SM2025-0051	SOMME - PDO10 - Contrôle annuel des deux i...	1 908,20
AIR LIQUIDE GENTILLY	SM-2025-00152	BCR SOMME - Oxygénothérapie - Visite annu...	2 205,43
ALFA LAVAL PIECES	SM-2025-00185	BCR SOMME - ATM 3-10 - EBL - INDEX 262 - P...	2 190,12
ALFA LAVAL PIECES	SM-CDE-2026-0033	BCR SOMME - EBL SLM - BET 967 534 - PRS po...	5 435,83
ALLRAY	SM-CDE-2026-0091	SME - AT3N10 - Gaine de ventilation	318,00
ALT	SM-CDE-2026-0137	BCR SME - TRANSPORT RSE 285 et 286	57,00
AMM	SM-CDE-2026-0044	SM AT3_10 Index 102 BS22/CMES/12 Compte...	13 277,00
APAVE BREST	SM-CDE-2026-0081	SM AT3_10 Index 3 Inspections ESP APAVE	1 825,00
APAVE BREST	SM-CDE-2026-0120	SM AT3_10 Index 3 Visites des ESP Requalificati...	445,00
ATELIERS HARTEREAU	SM-2025-00192	SM AT3_10 Index 68 BS22/CMES/11 : Touret d'...	2 900,00
ATELIERS HARTEREAU	SM-2025-00211	SM AT3_10 Index 42 BS22/CMES/11 :Freins Ma...	19 415,00
ATELIERS HARTEREAU	SM-CDE-2026-0047	SM AT3_10 Index 32 BS22/CMES/11 : Transmiss...	445,00
ATELIERS HARTEREAU	SM-CDE-2026-0057	SM AT3_10 Index 389 390 : visite commande m...	4 640,00
ATELIERS HARTEREAU	SM-CDE-2026-0145	SM AT3_10 Index 32 BS22/CMES/11 Remise en ...	4 500,00
BABCOCK	SM-2025-00244	SME AT3_10 - INDEX 187/188 FLOT - Chaudièr...	7 000,00
BELLION	SM-2025-00157	EBL BORD - Index 1307 - Visserie INOX pour le...	28,90

PARAMETRES

Navire

SOMM

Liste de travaux

SM_2026_ATM_3N10

NTI

Tout

Code comptable

PHT1ATSO

Imput°

AT

DMD & DFMD


01/01/2024

06/04/2025



Suivi opérationnel

Avancement des interventions



247

Nb FI



105

FI sans commande

36

FI à traiter

Avancement FI

Nb FI

SANS STATUT	9
10-5_ERQ_EMIS_BORD	8
08_erq_en_cours	1
07_ATTENTE_CRT	2
06_TVX_TESTES	4
05_en cours	11
04_commandé	45
03_partiellement_cdé	36
02_devis_demandé	95
01_a_traiter	36

Désignation (FI)

Entrée Désignation (FI)


Code (FI)	Désignation (FI)	NTI	Type intervention
SM-FI-2025-0262	ATM 2026 - EBL BORD - Filtrations pour AAG - MOTOPOMPE - BOSSOIRS	NTI_3	Hors FGV
SM-FI-2025-0273	ATM 2026 - EBL Bord - Index 129 - Joints pour guindeaux et cabestans de touage	NTI_3	Hors FGV
SM-FI-2025-0282	ATM 2026 - EBL BORD - INDEX 250-337-275-198-277-324 - PRS pour EPHR - motopompe - Zénith - EPAA - TR5 - EP hydrophore ED	NTI_3	Hors FGV
SM-FI-2025-0281	ATM 2026 - EBL BORD - INDEX 262 - PRS pour visite type 6000h de l'épurateur à huile	NTI_3	Hors FGV
SM-FI-2025-0269	ATM 2026 - EBL BORD - INDEX 309 - Douilles pour réseau éclairage	NTI_3	Hors FGV
SM-FI-2025-0274	ATM 2026 - EBL BORD - Index 324-198-218 - PRS pour pompes hydrophores, gasoil SNH40 et Réfrigération AA	NTI_3	Hors FGV
SM-FI-2025-0272	ATM 2026 - EBL BORD - Index 337-171-218-324-198 - PRS pour osmoseur, motopompe, EP hydrophore	NTI_3	Hors FGV
SM-FI-2025-0275	ATM 2026 - EBL BORD - Index 520 - JUPE DETANCHEITE J1 et J2	NTI_3	Hors FGV
SM-FI-2025-0261	ATM 2026 - EBL BORD - Index 64 - Câbles pour HD SOLIDE et GRUE 3000DaN	NTI_3	Hors FGV
SM-FI-2025-0263	ATM 2026 - EBL BORD - vis, boulons, goupilles, bagues CYCLAM	NTI_3	Hors FGV
SM-FI-2025-0271	ATM 2026 - Index 64 - FRI BORD - Deux câbles pour travaux manuels G4	NTI_3	Hors FGV

Code	désignation fournisseur	Engagé (PFA)
ABARNOU	ECHAFAUDAGE ABARNOU	47 869,00
ADS	Analyse Détection Sécurité	3 836,40
AIR LIQUIDE GENTILLY	AIR LIQUIDE Santé FRANCE	2 205,43
ALFA LAVAL PIECES	ALFA LAVAL PIECES	7 625,95
ALLRAY	SARL ALLRAY	318,00

CDE	Intitulé commande	Engagé (PFA)
SM-2025-00043	BS22/CMES/52 - Distribution et reprise TR5 - Visite accrocheur régulateur Zenith	682,28
SM-2025-00058	BCR SOMME - visite type 12000 H du MP Bd	223 900,60
SM-2025-00084	BS22/GEN/8 - Soutes à combustibles - Dégazage	186 154,00
SM-2025-00096	BCR SOMME - Kits de joints pour visite de type 12000H des deux	4 520,00

Etapes de préparation des données


1. Extraction des données de la GMAO

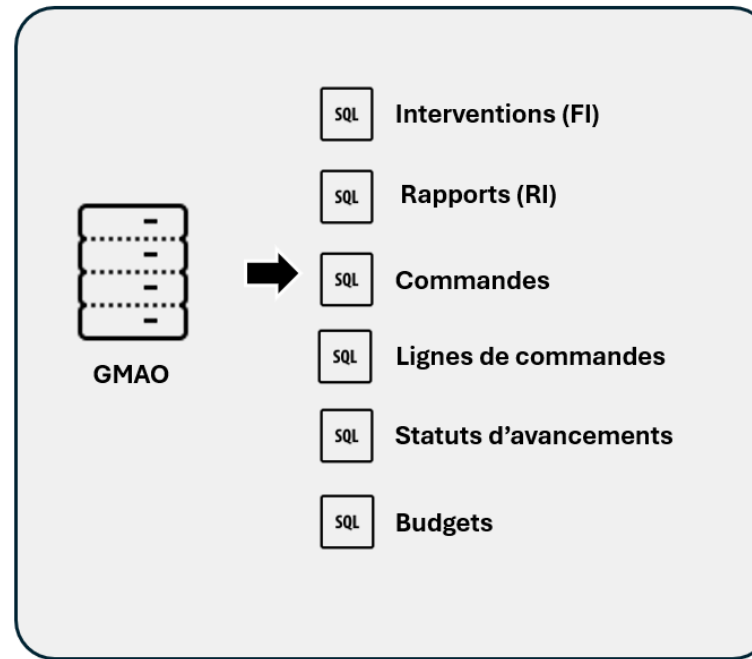

2. Création de tables dans power BI Desktop



3. Création de mesures DAX

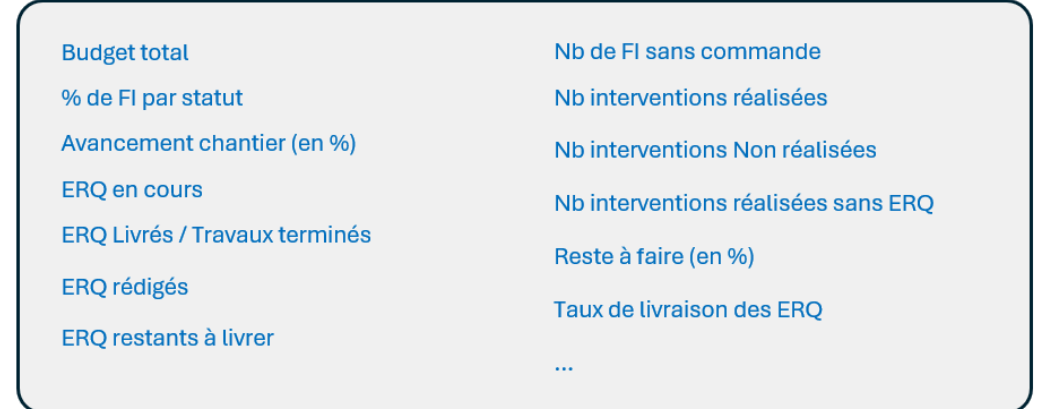



Le tableau de bord permet d'avoir une **vision consolidée et en temps réel des dépenses et de l'avancement des travaux**, facilitant ainsi le pilotage.

- Vision sur l'avancement (global, documentaire, financier).
- Alertes
- Vision synthétique et détaillée.

Il peut être utilisé même en cas de perte temporaire de connexion, ce qui arrive parfois sur les chantiers.

C'est un outil efficace pour le suivi de chantier, complémentaire à la GMAO.



Limites & propositions

Ce tableau est dépendant de la bonne tenue à jour du statut des Fiches d'interventions en GMAO. Les données doivent être mises à jour tout au long de la vie du chantier par un chef de chantier ou un planificateur.

Il serait possible d'y intégrer un Gantt (disponible sur le site de Microsoft), mais cela demande également que la planification soient bien réalisée en GMAO (date de début, durée, ressources,...).

Il serait également intéressant de corréler dans un graphique l'avancement financier et opérationnel.

Il faudrait pour cela exploiter les estimations à terminaisons faites pour les responsables navires.
